


PIEZĪMES:

1. Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus.
2. Materiāliem jāatbilst "Ceļu specifikācijas 2017".
3. Ceļa segas un seguma izbūves darbi jāveic atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017".
4. Aizbēršana jāveic pa kārtām ar augstumu 200mm.
5. Nesaistītajām minerālmateriālu stiprības klasēm jāatbilst N-III asfaltbetona seguma un N-III grants seguma ielu konstrukcijām, atbilstoši "Ceļu specifikācijai 2017".
6. Grunts nedrīkst būt sasalusi.
7. Cauruļvada montāžai, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošanai jānotiek sausā būvgrāvī.
8. Brauktuvi ar asfaltbetona segumu jāatjauno pilnībā līdz ielas apmalei vai asfaltbetona malai, vai ielas asij, ja atlikušais joslas platums no rakšanas vietas līdz ietves apmalei vai asfaltbetona malai, vai ielas asij ir mazāks par 1,5m.
9. Brauktuvi ar bruģa segumu jāatjauno ne mazāk kā divkārtšā rakšanas vietas platumā, proporcionāli uz visām rakšanas vietas pusēm.
10. Ietves un veloseliņi, neatkarīgi no segumu veida, jāatjauno ar betona bruģa segumu tā, lai atjaunotā seguma josla vismaz vienā pusē sniegtos līdz ietves vai veloseliņa malai. Ja neatjaunojamā daļa līdz apmalei paliek mazāka par 1,0 m, tad ietves vai veloseliņa segums jāatjauno pilnā platumā. Jāatjauno izjauktās ietves vai veloseliņa apmales.

PIEZĪMES:

1. Izlīdzinošā kārtā zem cauruļvada veidojama pie visiem esošās grunts tipiem;
2. Cauruļvadu atloku savienojumu vietās izlīdzinošajā kārtā izrokamas bedrītes;
3. Cauruļvada montāžai, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošanai jānotiek sausā būvgrāvī;
4. Cauruļvada izbūve atbilstoši ražotāja rekomendācijām;
5. Tranšējas aizpildāmais materiāls -salizturīgā grunts, ar daļiņu izmēru ne lielāku kā 16mm un daļiņu no 8-16 mm sastāvs nepārsniedz 10%;
6. Aizberamais materiāls nedrīkst saturēt organikas piemaisījumus;
7. Nedrīkst izmantot asus akmeņus vai citus skaldītus materiālus;
8. Aizbēršana jāveic pa kārtām ar augstumu 200 mm;
9. Ziemas laikā jāņem vērā, ka grunts nedrīkst būt sasalusi.
10. Atraktais posms nedrīkst būt garāks par 10.0 m. Aizberot tranšēju apbēruma slānis nedrīkst pārsniegt 1 m, un jāveic tūlītēja grunts blīvēšana.


CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ AR STIPRINĀJUMIEM

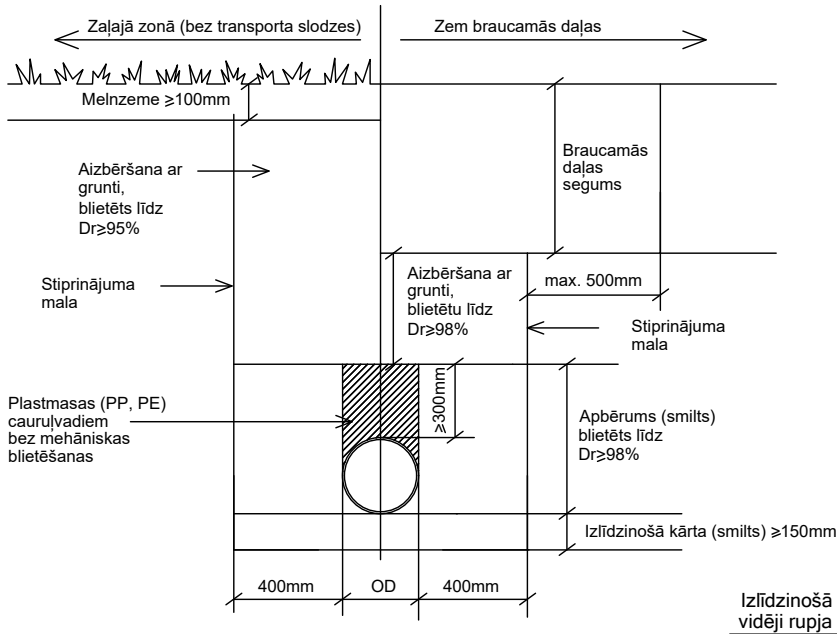

APZĪMĒJUMI:

OD - cauruļvada ārējais diametrs
Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)

TRANŠEJAS NOSTIPRINĀŠANA

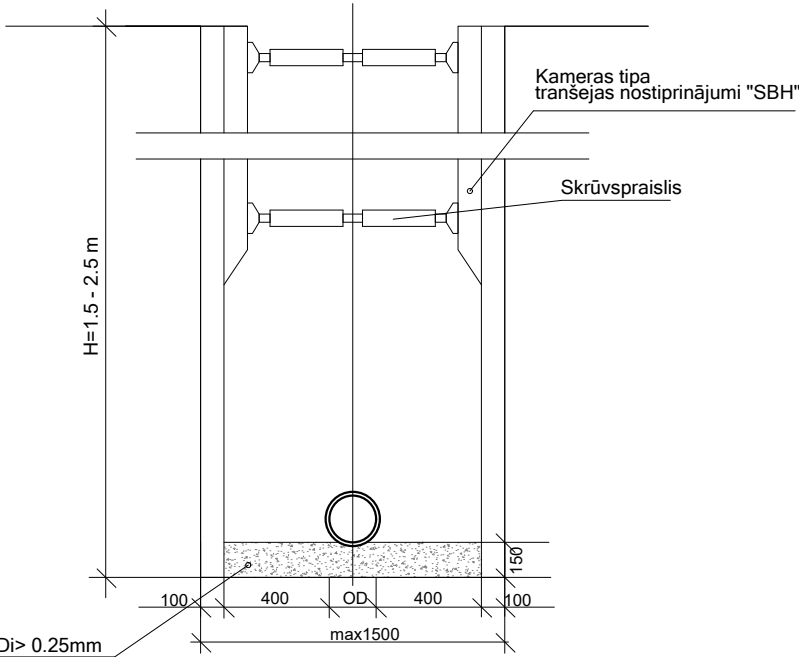

Izmaiņas	Datums	Apraksts			
Pasūtītājs:					
<div><div></div><div>Pašvaldības SIA „Liepājas ūdens” Reģ. Nr. 42103000897 Adrese: K.Valdemāra iela 12, Liepāja, LV-3401, Latvija, Tālr.: 63 423 417, E-pastslu@liepajas-udens.lv</div></div>					
LĪGUMS Nr.LU25.07/8					
Atbildīgais projektētājs:					
<div><div></div><div>SIA "LAKALME" Reģ. Nr. 40003379590 Adrese: Dzirmieku iela 26, Mārupe, Mārupes nov., LV – 2167, Tālr.: 67892745, E-pasts:lakalme@lakalme.lv</div></div>					
BK daļas projektētājs:					
<div><div></div><div>SIA "KONSTRUKTORIKS" Reģ. Nr. 40003852459 Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 4700-R Blaumaņa iela 38/40, Rīga, LV-1011 +371 25149649; birojs@konstruktoriks.lv</div></div>					
Būvobjekta nosaukums:					
Libiešu ielā 33, Liepāja, LV-3414					
AERĀCIJAS SISTĒMAS TVERTŅU PADEVES CAURUĻVADU PĀRBŪVEI LĪBIEŠU IELĀ 33, LIEPĀJĀ					
Rasējuma nosaukums:					
SEGUMA ATJAUNOŠANAS ROBEŽA. CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ. TRANŠEJAS NOSTIPRINĀŠANA. 1.PROJEKTA KĀRTA.					
Amats	Paraksts	Uzvārds	Datums		
Būvprojekta vad.		Jurijs Šepovalovs Sert.Nr. 3-00225	23.12.2025		
Būvproj. daļas vad.		Jurijs Šepovalovs Sert.Nr. 3-00225	23.12.2025		
Rasēja		Oskars Meirāns	23.12.2025		
Faila nosaukums Nr.LU25.07/8		MĒROGS b/m	STADIJA BP	MARKA DOP	LAPA 3
